

Código: 11-0819

Título: REPERFILADO DE ARENA Y ACTUACIÓN COMPLEMENTARIA DE ENTARIMADO DE MADERA PASARELAS PEATONAL EN LA PLAYA DE EL PALMAR

Situación: Vejer de la Fra.

PROBLEMÁTICA:

En la playa de El Palmar existen una serie de pasarelas de maderas instaladas por la Dirección General de Costas en el año 2002 para facilitar el acceso peatonal a la playa a través de la zona dunar, sirviendo a su vez de protección a la vegetación dunar evitando el trasiego indiscriminado.

En la actualidad las pasarelas se encuentran invadidas por la duna en su extremo final junto a la playa rebasando en algunos tramos la altura de los pasamanos, imposibilitando el uso normal de los usuarios y sobre todo el acceso de los minusválidos.

La solución de retirar la arena de la pasarela, precisaría el empleo de medios mecánicos y no se considera viable pues dañaría de manera considerable el cordón dunar. Por ello, y como alternativa se pretende la colocación de entarimado de madera del mismo ancho que la pasarela, colocado directamente en la arena, lo cual facilita el paso peatonal.

ACTUACIONES:

La actuación ha consistido en el movimiento de la arena acumulada en la parte alta del perfil colindante con el sistema de tablestacado, y movimiento de la arena y transvase a los puntos bajos mediante perfilado transversal y longitudinal.

La regularización de arena afecta a una longitud de playa de 800 ml mediante el empleo de traíllas remolcadas con apoyo de maquinaria de reperfilado.

Las pasarelas de madera se encuentran invadidas de arena en su extremo final de la playa. La retirada de la arena solo podría realizarse mediante el empleo de medio mecánicos que destrozaría el cordón dunar. Por ello se ha efectuado la implantación de entarimado de madera sobre la arena de las propias pasarelas.

La actuación se realiza en aquellas pasarelas comprendidas entre la torre vigía y el río Conilete, límite del término municipal de Vejer con Conil. La longitud de entarimado fabricado y colocado es de 300 metros lineales.


PLAZO: 1 semana

PRESUPUESTO: 31.740 €.

SITUACIÓN:



ANTES:

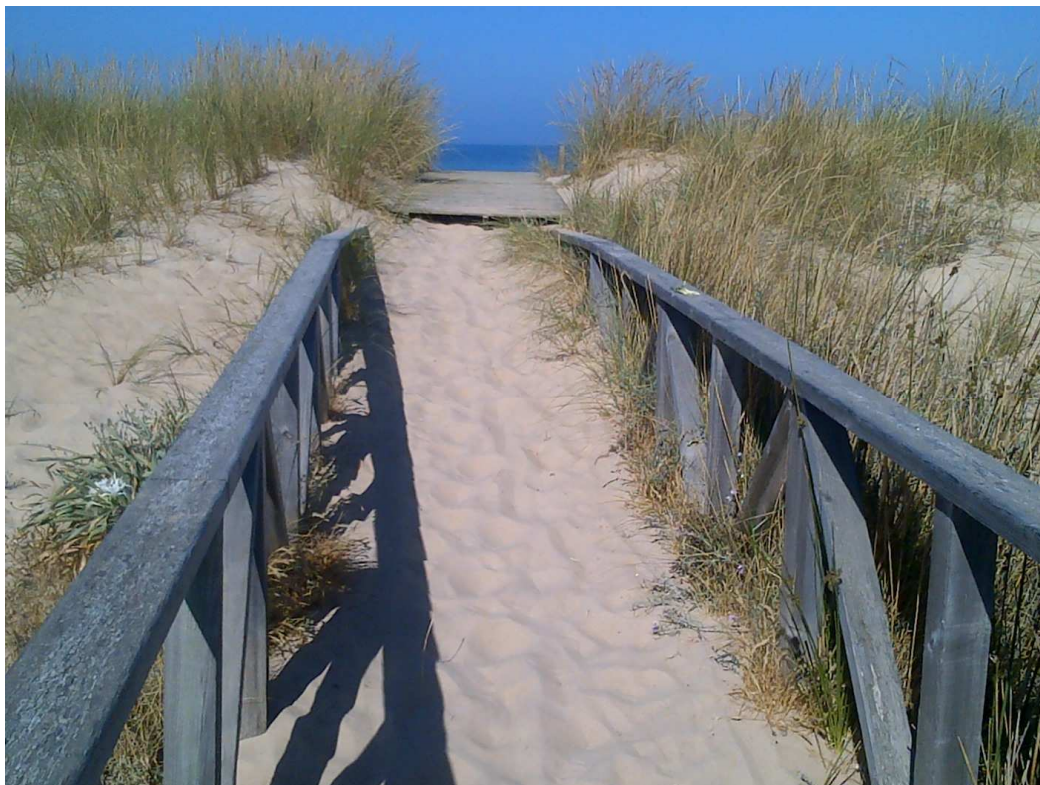

DESPUÉS:

